

安全パトロール報告書


| | | |
|------|--------------------------|--------------|
| 日 時 | 令和 7年 7月 11日 | 午前 9 時 30 分頃 |
| 場 所 | 大阪市西区江戸堀 大同生命保険(株)大阪本社ビル | |
| 作業内容 | ガラス清掃 ロープ高所作業 | |
| 会員区分 | 会員 | 非会員 |

安全対策内容

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| ① ライフラインの設置確認 | あり | なし |
| ② メインロープの強度等の認識確認 | あり | なし |
| ③ 調査及び記録表の確認 | あり | なし |
| ④ 作業計画書の確認 | あり | なし |
| ⑤ 作業指揮者の確認 | あり | なし |
| ⑥ 墜落制止用器具の使用確認 | あり | なし |
| ⑦ 保護帽の確認 | あり | なし |
| ⑧ 作業開始前点検の確認 | あり | なし |
| ⑨ 特別教育の受講確認 | あり | なし |
| ⑩ 用具落下防止の確認 | あり | なし |
| ⑪ 立入禁止区域の確認 | あり | 指導あり |
| ⑫ 歩行者誘導員の確認 | あり | なし |
| ⑬ ロープ養生の確認 | あり | 指導あり |
| ⑭ 下降器の種類 | ラック フルハーネス着用 | |
| ⑮ 使用ロープの種類 | セミスタティックロープ10.5mm | |

指導・内容

玄関近くの作業中で、地上誘導員も配置され、しっかりと安全対策が取られていた。
立入禁止区域仕切りにトラロープを使用していたが、より目につきやすいトラバーの方が望ましいと指導した。
一番上は養生されていたが、2段目のロープが建物に接触しているところにも養生が望ましいと指導した。
熱中症対策の義務化を伝え、こまめな休憩を行ってもらうよう注意喚起した。

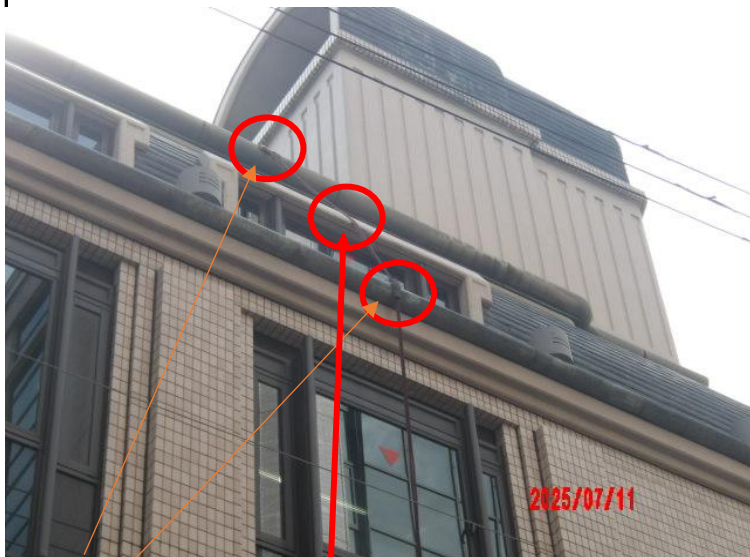


養生されている。 養生されていない！
接触角度は低いが養生した方が望ましい。



立入禁止区域のトラロープがだれてしまっている。
トラバーの方が目立ちやすく隔離できるので望ましいと指導した。誘導員は配置されていた。◎

安全パトロール報告書

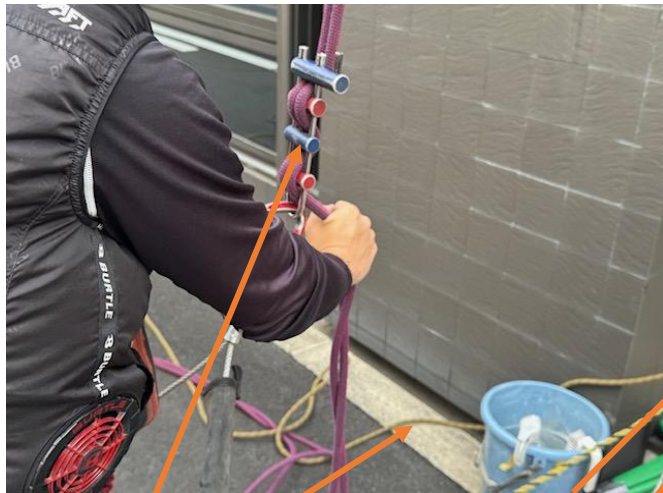

下降器 ラック

用具落下防止器具◎

ライフラインロープ(色分け)

フルハーネス着用◎



作業内容確認中



作業内容確認中



チェアー型ゴンドラ作業も準備中であつたが、ちょうど休憩に入り作業を確認できなかった。
